




29690 Lindwedel - Mittelstraße 2a - Tel : Tel. 05073-923168

**Auftraggeber:**

Mustermann GmbH  
 Teststraße 1  
 10000 Musterhausen

**Protokoll Dichtheitsprüfung Rohr - Luft/EN 1610**

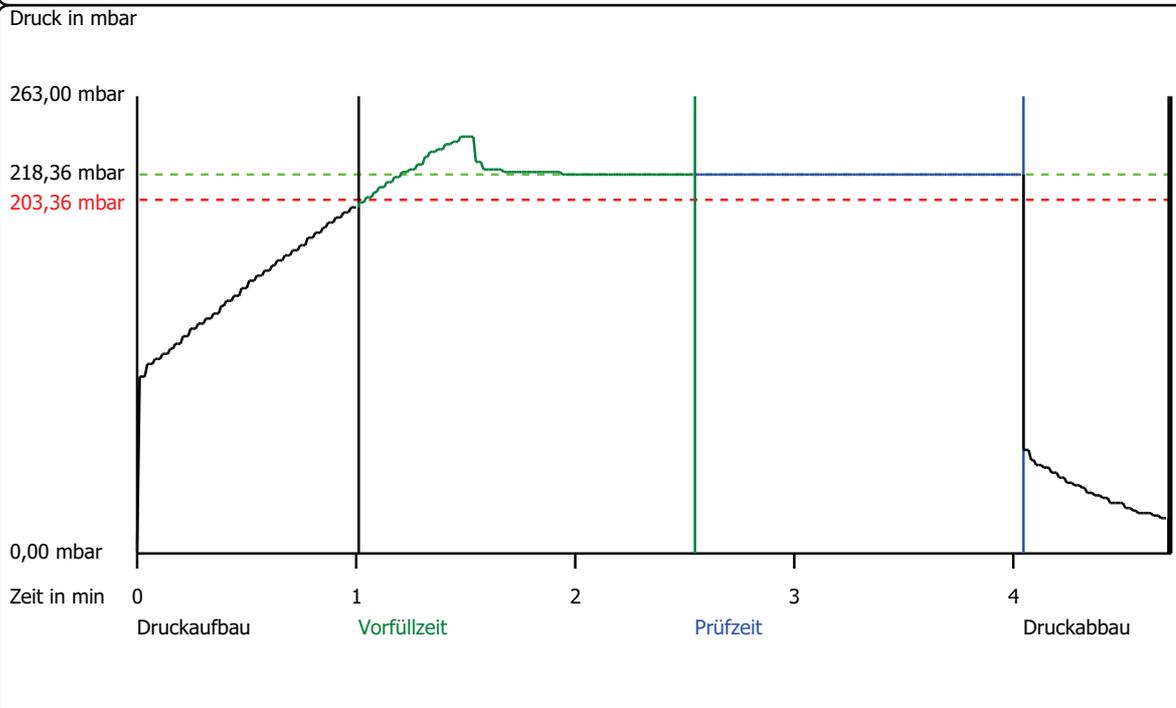

Standort	: Am Musterfeld Ecke Muster Str.	Plan-Nr.	:
Ort	: Musterstadt	Haltungsnummer	: KLR 3
Straße	: Am Nordfeld	von Schacht	: KLR GW 3
Prüfer	:	bis Schacht	: KLR SB 3
Prüfausrüstung	: MASTERTEST® SN:090602	Länge Prüfstrecke	: 120,0 m
Auftrags-Nr.	: 2010 A 0001	ohrprofil:	K reis
Prüfdatum	: 27.11.2010 10:20:05R	Durchmesser	: 100 mm
Prüfmethode	: Luft/EN 1610	Rohrnummer	:
Prüfklasse	: Luft LD	Innenschutz	: ohne
Bereich	: Rohr		
Material	: PE 100		
Bemerkung	:		

Sensor	: PMC131 -300 - +300 mbar, SN: C4056C01052	Sensorprüfung	: 18.11.2010
Zulassung	: Werkskalibrierung		

Prüfdruck	: 200,00 mbar	Vorfüllzeit	: 1:32 min
zul. Druckverlust	: 15,0 mbar	Prüfzeit	: 1:30 min
tats. Druckverlust	: -0,2 mbar	Ergebnis	: <b>bestanden</b>

-----  
 Prüfer

-----  
 Auftraggeber
